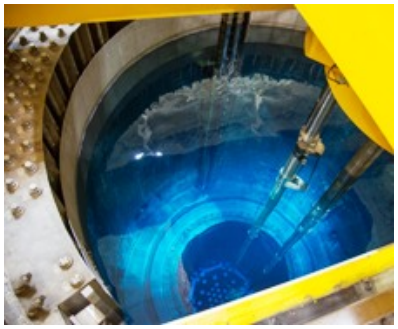


**V pátek 5.9. odfázoval personál 1. výrobního bloku obě turbíny a zahájil odstávku pro výměnu paliva a realizaci naplánovaných úprav, údržbu a rekonstrukce zařízení 1. bloku, která je plánována na 26 dnů. Snižování výkonu bylo zahájeno v pátek ve 12:00 hod. z výkonů reaktoru 95,5% na konci palivové kampaně při výkonu turbín TG21 -230MW a TG22 -234MW. TG 11 - Marie - byla odfázována ve 16:35 a TG12 – Alena - v 17:55 hod**

Termín odstávky bloku je stanoven od 6. 9. do 1. 10. 2014, plánovaná délka odstavení bloku je 26 dnů. Odstávka s výměnou jaderného paliva obsahuje také některé významné investiční akce:

Revize olejového hospodářství, olejových chladičů a dalších zařízení TG Marie a TG Alena

Revize a opravy vysokotlakých odběrů obou turbín

Po odstavení bloku bude zahájena údržba sudé poloviny strojovny

Tříletá revize a údržba dieselgenerátoru 1QV

Revize a údržba 1.ES

Revize a údržba elektrorozvodny BV

Napojení a zkoušky AAC DG pro 1 HVB do rozvoden EV,CV,DV,

**Jiří Bezděk**
